

## ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO

### Lista de tareas

PRIORIDAD	TÍTULO	DIFICULTAD	TIEMPO ESTIMADO (horas)
ALTA	Organización proyecto	BAJA	1
ALTA	Características comunes	MEDIA	3
MEDIA-ALTA	Página <i>Home</i>	MEDIA-ALTA	4
MEDIA-ALTA	Página <i>Sobre nosotros</i>	MEDIA-ALTA	4
MEDIA-ALTA	Página <i>Servicios</i>	MEDIA-BAJA	2
MEDIA-ALTA	Página <i>Galería</i>	MEDIA-ALTA	4
MEDIA-ALTA	Subpáginas	MEDIA-BAJA	6
MEDIA-ALTA	Formulario <i>Servicios</i>	MEDIA-ALTA	5
MEDIA-ALTA	Formulario <i>Más información</i>	ALTA	6
MEDIA	Registro incidencias	BAJA	1
MEDIA	Registro lecciones	BAJA	1
ALTA	Cronograma	BAJA	1
MEDIA	Métricas de calidad	MEDIA	1
MEDIA-BAJA	Documentación de requisitos	BAJA	1
BAJA	Documentación de riesgos	BAJA	1
MEDIA-BAJA	Documentación de herramientas	BAJA	1
TOTAL TIEMPO ESTIMADO			42

PRIORIDAD	TÍTULO	DIFICULTAD	TIEMPO REAL (horas)
ALTA	Organización proyecto	BAJA	1
ALTA	Características comunes	MEDIA	3
MEDIA-ALTA	Página <i>Home</i>	MEDIA-ALTA	3
MEDIA-ALTA	Página <i>Sobre nosotros</i>	MEDIA-ALTA	3
MEDIA-ALTA	Página <i>Servicios</i>	MEDIA-BAJA	1
MEDIA-ALTA	Página <i>Galería</i>	MEDIA-ALTA	3
MEDIA-ALTA	Subpáginas	MEDIA-BAJA	7
MEDIA-ALTA	Formulario <i>Servicios</i>	MEDIA-ALTA	5
MEDIA-ALTA	Formulario <i>Más información</i>	ALTA	5
MEDIA	Registro incidencias	BAJA	0.25
MEDIA	Registro lecciones	BAJA	0.25
ALTA	Cronograma	BAJA	1
MEDIA	Métricas de calidad	MEDIA	0.25
MEDIA-BAJA	Documentación de requisitos	BAJA	0.25
BAJA	Documentación de riesgos	BAJA	0.5
MEDIA-BAJA	Documentación de herramientas	BAJA	0.5
TOTAL TIEMPO REAL			34

## Registro de incidencias

**30/08/2020**

Al intentar introducir los submenús en el menú principal la web colapsa, paso a crear el menú desde cero y aplicarlo a las páginas ya hechas.

**31/08/2020**

Al crear el formulario de *Más información* en un *lightbox*, no consigo que sea totalmente *responsive*; ajusto para los principales teléfonos y tablets, pero no consigo que sea *responsive* en el eje horizontal.

**01/09/2020**

En las comprobaciones de funcionamiento en los principales navegadores, encuentro discrepancias de estilo, sobre todo en Internet Explorer y alguna en Firefox. Tanto en Chrome como en Windows Edge, la página funciona según lo deseado. No se realizan pruebas en Safari debido a la imposibilidad de instalar la última versión en Windows 10.

## Registro de lecciones aprendidas

**29/08/2020**

Creación de *slider*.

**29/08/2020**

Reproductor de vídeos de Youtube integrado, reactivo a cambios de pantalla.

**30/08/2020**

Creación de *lightbox* con JavaScript nativo.

**01/09/2020**

Validación de formularios con JavaScript nativo.

## Métricas de calidad

- Código HTML validado por W3C.
- Código css validado por W3C.

## Documentación de requisitos

Es necesario disponer de la última versión de los principales navegadores web.

## Documentación de riesgos


En la web aparecen imágenes que no son libres de derechos, por lo que se recomienda no *hostear* la página para evitar problemas con los derechos de autor o *copyright*.

## **Documentación de herramientas**


- Visual Studio Code.
- Github.
- W3C validator.

## Testeo con los principales navegadores

### Google Chrome

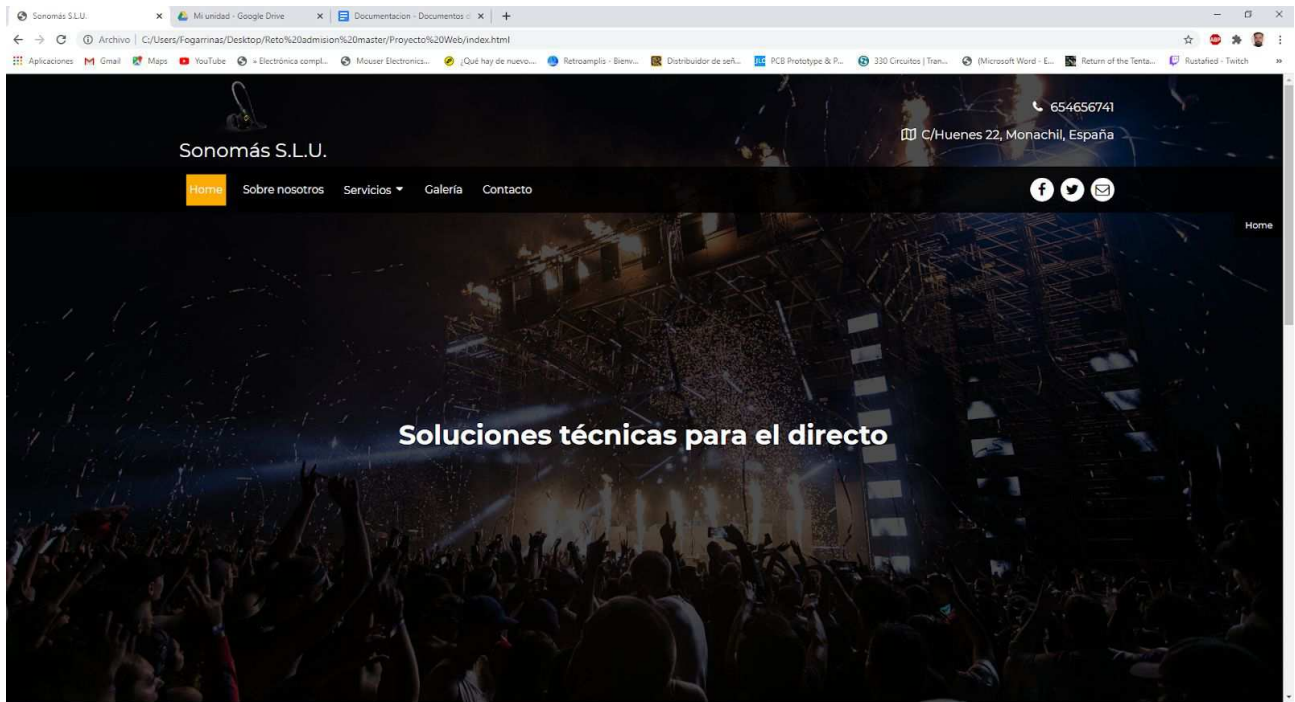


### Firefox

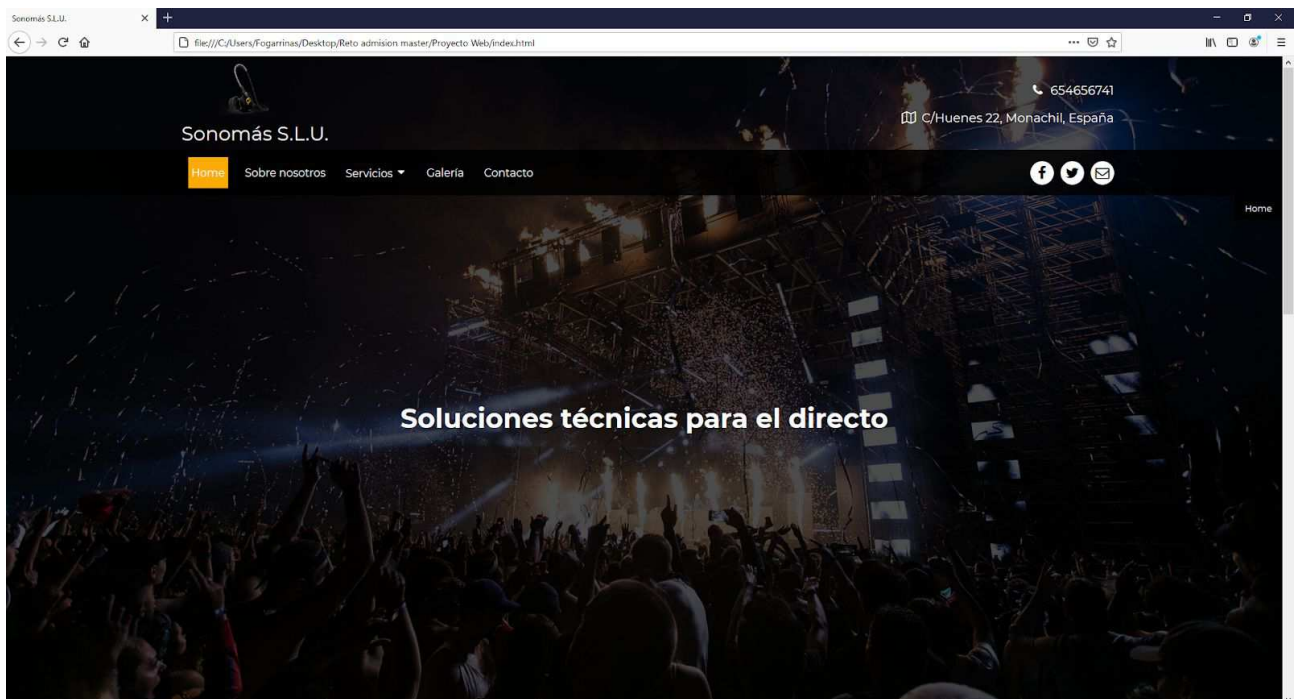


Creación página web de empresa  
Raúl Cátedra Martínez

Internet Explorer

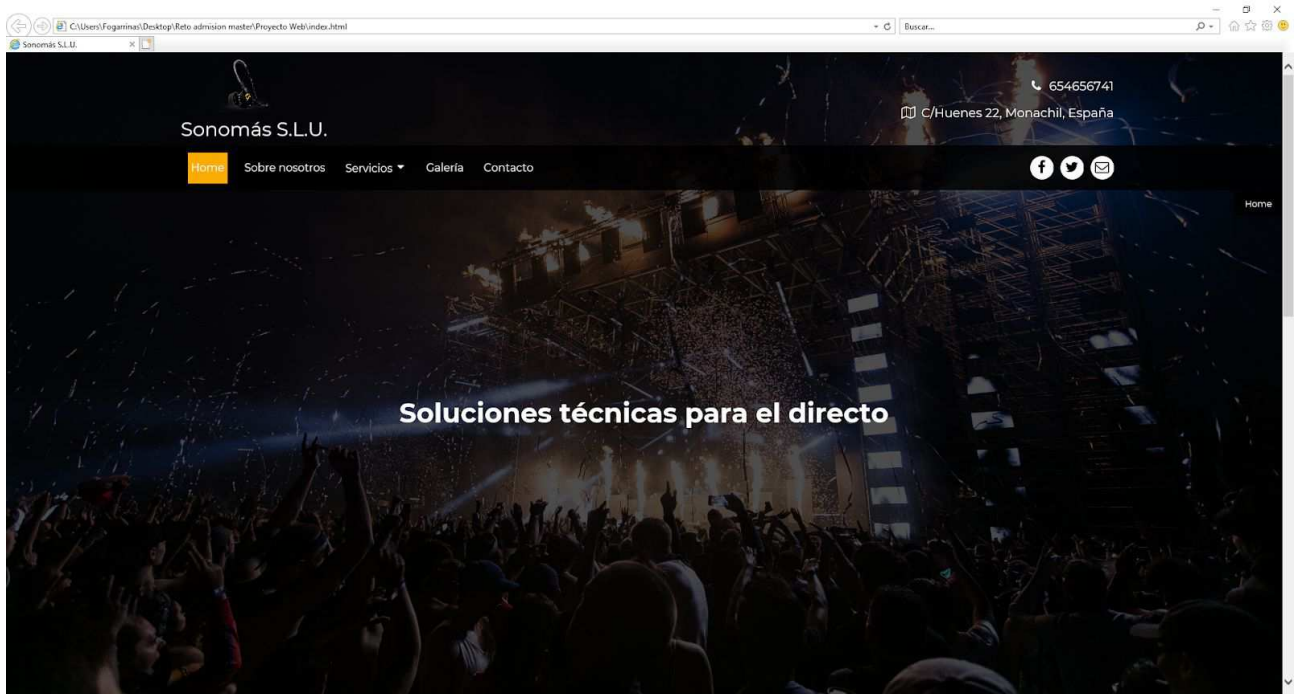

Microsoft Edge

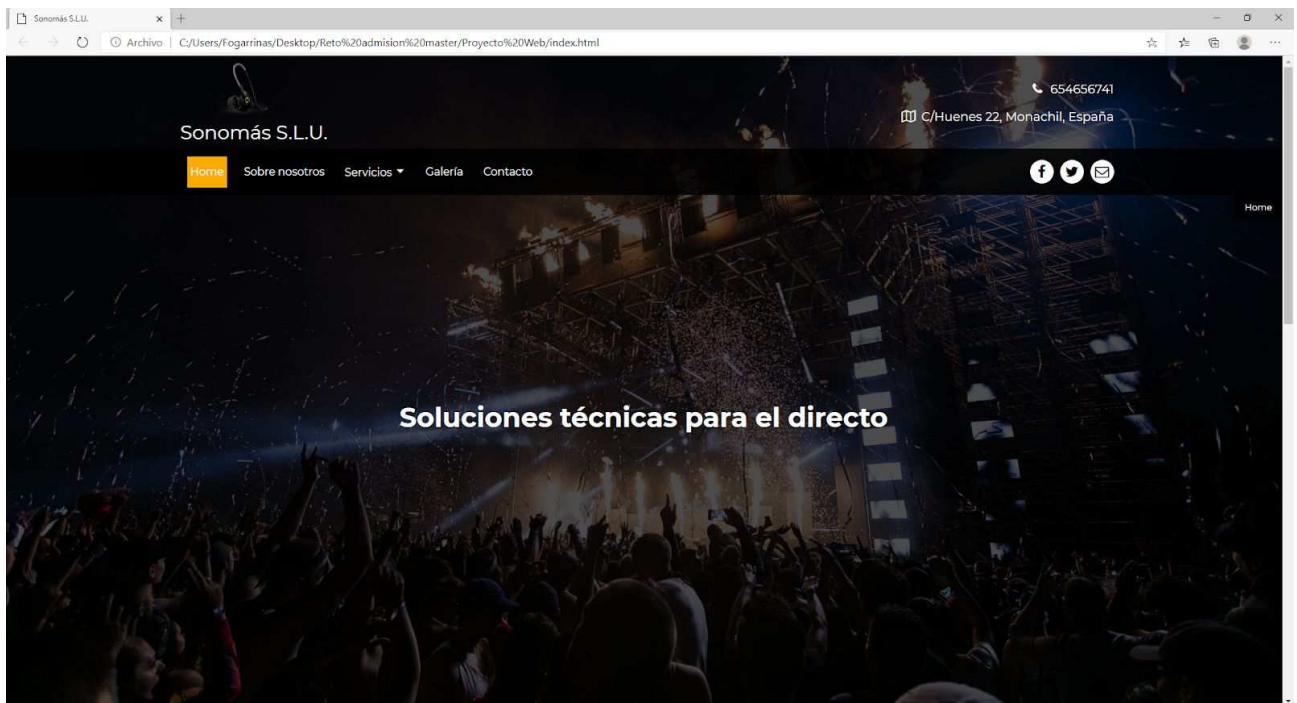

# **ANEXO: CRONOGRAMA**

HORAS/FECHA	08/27/20	08/28/20	08/29/20	08/30/20	08/31/20	09/01/20	09/02/20
0							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							

TAREA	COLOR
Lectura de reto, búsqueda de ideas, aprendizaje de HTML y CSS para creación de página	
Organización de proyecto	
Cronograma	
Características comunes	
<i>Slider</i>	
Terminar página <i>Home</i>	
Página <i>Sobre nosotros</i>	
Página <i>Servicios</i>	
Introducción de submenús	
Subpáginas <i>Servicios</i>	
Página <i>Galería</i>	
Aprendizaje de validaciones con JavaScript	
Creación y validación de formulario <i>lightbox</i> para subservicios	
Creacion de página de contacto, formulario y validación	
Finalización de web, revisión y últimos retoques	
Finalización de documentación e inclusión en la carpeta raíz del proyecto	
<i>Deadline</i>	
